

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE SARDEGNA - SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1	x	x	x	x		28.655.588,00 €	20.064	5.968
Avviso n.2	x	x	x	x		46.880.000,00 €	20.960	4.454

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
134.624	153.880	119.255	88,6	85,87	56,0	54,3	8,3

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	66,7	19,6	12,0	1,2	0,4

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formati (valore realizzato)	Di cui Formati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
44.194	17.514	16.601	12.740	2.126	28,8	12,1

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
29	24	13	54,2%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
211.992.002,00 €	24.618.000,00 €	75.535.588,00 €	321.580,85 €	x			

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO****INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO****Obiettivi attesi**

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività previste nei Piani.
Tutti i 39 CPI della Regione devono aver realizzato tutte le attività previste nel piano di potenziamento. Di questi 39 CPI, 11 rappresentano sedi decentrate.

Numero di CPI operativi

57 (44 sedi centrali + 13 sedi distaccate)

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI Sardegna

Tipologia	Nr	Data Emissione
Deliberazione	3541	09/07/2020

Dettaglio delle attività

Regione Autonoma della Sardegna
(Centri per l'impiego: 39 sedi di cui 28 Centri per l'impiego e 11 sedi decentrate)

Comunicazione
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 310.458,24
Aggiornamento Piano: € 378.136,24)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 67.588,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 310.548,24	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0,00	
Piano di comunicazione integrata ASPAL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Analisi e definizione capitolato tecnico per il servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata	-	156.160,00 €		Tutti i CPI
		Servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata				
		- Realizzazione campagne di comunicazione digital e video storytelling a supporto dei servizi offerti nei CPI (Video tutorial, video di servizio, video promozionali) - Realizzazione di campagne di comunicazione su media tradizionali - Realizzazione materiale di				

		comunicazione BTL di supporto per le attività dei CPI per cittadini e imprese (brochure, depliant, gadget, materiale informativo), tra cui la diffusione di materiali elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione di campagne coordinate per specifici programmi nazionali				
Formazione Digital marketing e Social media management team comunicazione	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Analisi dei percorsi formativi specifici per il team comunicazione	-	0,00 €		Tutti i CPI (Team comunicazione, attività trasversale)
	Aggiornamento Piano PNRR	Selezione percorsi formativi specifici e realizzazione documento di sintesi dei percorsi formativi da realizzare Realizzazione di percorsi formativi specifici per il team comunicazione	-	26.288,24 €		
Rete dei referenti della comunicazione interna	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Rafforzamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso la costituzione della rete dei referenti per la comunicazione interna ASPAL	0,00 €			Tutti i CPI
Ottimizzazione delle attività di PR online reportistica online e monitoraggio	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Attività prevista in sinergia con la piattaforma di social media management per la gestione e ottimizzazione dei canali sociali istituzionali	0,00 €			Tutti i CPI
Rafforzamento attività di e-mail marketing e newsletter AspalPost	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Gestione flussi informativi e di comunicazione attraverso attività di email marketing e newsletter aspalPOST	0,00 €			Tutti i CPI

Acquisto/noleggio piattaforma di Social media Management per la gestione e ottimizzazione dei canali social istituzionali	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Analisi piattaforme Social Media Management, nella successiva realizzazione di un documento di sintesi e nell'acquisto servizio fornitore esterno		6.100,00 €		Tutti i CPI
Realizzazione sistema di segnaletica e cartellonistica interna CPI di tipo "informativa/promozionale"	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Analisi sistema di segnaletica e cartellonistica		0,00 €		Tutti i CPI
	Aggiornamento Piano PNRR	Realizzazione sistema di segnaletica		85.400,00 €		
Animazione territoriale	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Realizzazione open days dedicati alla formazione	0,00 €			- CPI di Alghero CPI di Assemini e Sede decentrata di Pula - CPI di Castelsardo CPI di Ozieri - CPI di Sassari e sede decentrata di Porto Torres - CPI di Bonorva CPI di Cagliari - CPI di Quartu Sant'Elena
Presidio e animazione dei principali profili social istituzionali: Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	- Studio, analisi e definizione dei target per ogni canale social; setup, creazione, lancio e monitoraggio di video sponsorizzati sui canali social - Presidio e animazione quotidiana dei principali profili social istituzionali: Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube	0,00 €			Tutti i CPI
Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL – analisi nuova architettura	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Analisi nuova architettura del sito web www.aspalsardegna.it	0,00 €			Tutti i CPI
Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL – realizzazione nuovo sito	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Realizzazione nuovo sito ASPAL	67.588,00 €			Tutti i CPI

Realizzazione della Carta dei Servizi di ASPAL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Pianificazione e benchmarking, raccolta schede dei servizi erogati dai CPI e dell'ASPAL e redazione del documento finale		36.600,00 €		Tutti i CPI
--	--	--	--	-------------	--	-------------

Formazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 1.035.160,82 Aggiornamento Piano: € 1.250.160,82)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 468.779,01	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 487.482,55	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 293.899,26	
Progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del Piano formativo del personale ASPAL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lotto contabilità amministrativo e trasparenza, rif. Determinazione n. 1636 del 14 settembre 2018 rimodulato con Determinazione n. 762 del 04 giugno 2020		118.452,60 €		Tutti i CPI + Sede centrale
Progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del Piano formativo del personale ASPAL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lotto risorse umane, rif. Determinazione n. 1636 del 14 settembre 2018 rimodulato con Determinazione n. 762 del 04 giugno 2020		70.978,95 €		Tutti i CPI + Sede centrale
Progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del Piano formativo del personale ASPAL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lotto servizi lavoro, rif. Determinazione n. 1636 del 14 settembre 2018 rimodulato con Determinazione n. 762 del 04 giugno 2020		258.151,00 €		Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione LEP J	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Percorso di livello Executive per la formazione dei Referenti ASPAL per le politiche di conciliazione nei Centri per l'Impiego.		39.900,00 €		Tutti i CPI + Sede centrale

		Percorso formativo in FaD rivolto a tutti i dipendenti di ASPAL sui temi della conciliazione				
Progetto Forplus	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Percorsi formativi sull'erogazione delle politiche attive del lavoro. I percorsi si basano su attività formative LEP based di tipo digital blended che prevedono contenuti online e attività di tipo collaborativo a distanza	0,00 €			Tutti i CPI
Formazione personale ASPAL 2021	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche	323.912,31 €			Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione personale ASPAL 2022	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche	72.025,74 €			Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione obbligatoria su prevenzione corruzione e trasparenza	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Servizio di formazione obbligatoria generale sulla prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza	8.560,00 €			Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione sulle politiche attive del lavoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Servizio di formazione a distanza riguardante il riallineamento delle competenze in merito alle tematiche di politiche attive del lavoro per il personale dell'ASPAL	39.000,00 €			Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione in materia di adempimenti privacy	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Attività per il rafforzamento delle competenze del personale ASPAL in materia di adempimenti connessi alla normativa sulla privacy	25.280,96 €			Tutti i CPI + Sede centrale
Microsoft PowerApp e Microsoft PowerAutomate	Aggiornamento Piano PNRR	Formazione rivolta al personale per promuovere l'utilizzo di soluzioni, attraverso la configurazione di app e automazioni, all'interno dell'organizzazione.			6.281,78 €	- CPI di Bonorva - CPI di Ozieri - Sede decentrata di Tortoli, afferente al CPI di Lanusei - CPI di Nuoro - CPI di Sassari - CPI di Senorbi

						- CPI di Mogoro - CPI di Oristano - Sede centrale
Disability Manager	Aggiornamento Piano PNRR	Formazione di personale volto a favorire l'accessibilità alle persone disabili degli edifici e dei sistemi informativi			32.617,48 €	Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione inerente alle competenze direzionali in materia di Lavoro Agile	Aggiornamento Piano PNRR	Adeguamento delle competenze per il personale avente incarichi di coordinamento in merito alla gestione del personale adibito al lavoro agile			40.000,00 €	Tutti i CPI + Sede centrale
Formazione specialistica per i Case Manager	Aggiornamento Piano PNRR	Tale formazione si è resa necessaria nell'ambito del percorso 4, programma GOL al fine di approfondire le caratteristiche dell'utente ed accompagnarlo nello sviluppo personale e professionale dell'utente			215.000,00 €	Tutti i CPI + Sede centrale

**Osservatorio
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: €
Aggiornamento Piano: €)**

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	

Adeguamento strumentale e infrastrutturale
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 10.000.000,00
Aggiornamento Piano: € 14.625.068,50)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 7.894.106,08	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 3.063.398,14	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 3.667.564,28	
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Ales	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri. Piano straordinario di potenziamento CPI - Intervento 3.4. - Lotto 1 Ales		59.675,89 €		CPI di Ales
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Oristano	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri. Piano straordinario di potenziamento CPI - Intervento 3.4. - Lotto 2 Oristano		53.399,90 €		CPI di Oristano
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Quartu Sant'Elena	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri. Piano straordinario di potenziamento CPI - Intervento 3.4. - Lotto 3 Quartu Sant'Elena		76.621,50 €		CPI di Quartu Sant'Elena
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Sanluri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri. Piano straordinario di potenziamento CPI - Intervento 3.4. - Lotto 4 Sanluri		140.079,67 €		CPI di Sanluri

Adeguamento impiantistico e infrastrutturale dei CPI di Assemini e Carbonia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto e posa in opera ex novo e in sostituzione di condizionatori in diversi CPI	27.538,45 €			CPI di Assemini e CPI di Carbonia
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Olbia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto e posa in opera ex novo e in sostituzione di condizionatori al CPI di Olbia	27.245,04 €			CPI di Olbia
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale di diversi CPI	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Servizio di sostituzione di condizionatori presso gli immobili in uso all'ASPAL		138.600,00 €		Tutti i Cpi
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Dorgali	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adequamento	120.000,00 €			Sede decentrata di Dorgali, afferente al CPI di Nuoro
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Alghero	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adequamento	1.200.000,00 €			CPI di Alghero
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Castelsardo	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adequamento	600.000,00 €			CPI di Castelsardo
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Siniscola	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adequamento	600.000,00 €			CPI di Siniscola
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Palau	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adequamento	800.000,00 €			Sede decentrata di Palau, afferente al CPI di Olbia

Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Muravera	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adeguamento	450.000,00 €			CPI di Muravera
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Tempio Pausania	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adeguamento	600.000,00 €			CPI di Tempio Pausania
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Iglesias	Aggiornamento Piano PNRR	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici della nuova sede del CPI di Iglesias.			300.000,00 €	CPI di Iglesias
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Porto Torres	Aggiornamento Piano PNRR	Interlocuzioni per individuazione nuova sede			435.000,00 €	Sede decentrata di Porto Torres, afferente al CPI di Sassari
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Bosa	Aggiornamento Piano PNRR	Lavori di adeguamento della sede decentrata di Bosa, presso la sede locale del centro polifunzionale lavoro e formazione (CPLF)			80.000,00 €	Sede decentrata di Bosa, afferente al CPI di Cuglieri
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Sassari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del centro polifunzionale lavoro e formazione (CPLF) di Sassari, sito in via Auzzas, n.1		870.000,00 €		Sede CPI Sassari
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Olbia	Aggiornamento Piano PNRR	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del centro per l'impiego e del centro polifunzionale lavoro e formazione (CPLF) di Olbia, sito in via Piemonte			1.100.000,00 €	Sede CPI Olbia
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Carbonia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento conservativo e adeguamento degli impianti elettrico, dati e di illuminazione, dei locali del centro polifunzionale lavoro e formazione		234.343,77 €		Sede CPI Carbonia

	Aggiornamento Piano PNRR	(CPLF) di Carbonia sito in via Costituente n. 43			652.564,28 €	
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Lanusei	Aggiornamento Piano PNRR	Lavori di riqualificazione e manutenzione ordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici dei locali del centro polifunzionale lavoro e formazione (CPLF) di Lanusei			800.000,00 €	Sede CPI di Lanusei
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di San Gavino Monreale	Aggiornamento Piano PNRR	Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del CPI di San Gavino			300.000,00 €	Sede CPI di San Gavino Monreale
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Senorbì	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici della nuova sede del CPI di Senorbì	179.322,59 €	320.677,41 €		Sede CPI di Senorbì
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Tortolì	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale della sede decentrata di Tortolì o, alternativamente, ricerca e interlocuzioni per individuazione nuova sede/adeguamento	530.000,00 €			Sede decentrata di Tortolì, afferente al CPI di Lanusei
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Cagliari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Cagliari	260.000,00 €			CPI di Cagliari
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Nuoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Nuoro	1.700.000,00 €			CPI di Nuoro
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Oristano	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano	800.000,00 €			CPI di Oristano

Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Orosei	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale della sede decentrata di Orosei		350.000,00 €		Sede decentrata di Orosei, afferente al CPI di Siniscola
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale della sede decentrata di Gavoi	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del decentrata di Gavoi		220.000,00 €		Sede decentrata di Gavoi, afferente al CPI di Nuoro
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale del CPI di Cuglieri e San Gavino Monreale	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Fornitura e posa di impianto di climatizzazione		100.000,00 €		CPI di Cuglieri e CPI di San Gavino Monreale
Adeguamento impiantistico e infrastrutturale	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Fornitura e posa di impianto di videosorveglianza e servizi connessi presso gli immobili ASPAL		500.000,00 €		Tutti i CPI

Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 2.000.000,00 Aggiornamento Piano: € 2.000.000,00)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 2.000.000,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Ales	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		18.497,39 €		CPI di Ales

Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Alghero	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		35.003,05 €		CPI di Alghero
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Assemini	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		70.308,30 €		CPI di Assemini e sedi decentrate di Pula e Teulada
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Bonorva	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		30.521,16 €		CPI di Bonorva
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Cagliari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		70.996,30 €		CPI di Cagliari
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Carbonia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		43.893,48 €		CPI di Carbonia
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Castelsardo	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		28.323,52 €		CPI di Castelsardo
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Cuglieri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		46.590,28 €		CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Ghilarza	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		40.588,78 €		CPI di Ghilarza

Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Iglesias	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		40.280,74 €		CPI di Iglesias
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Isili	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		25.277,34 €		CPI di Isili
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Lanusei	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		71.509,77 €		CPI di Lanusei e sede decentrata di Tortolì
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Macomer	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		35.357,69 €		CPI di Macomer
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Mogoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		21.470,55 €		CPI di Mogoro
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Muravera	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		28.903,54 €		CPI di Muravera
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Nuoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		89.523,27 €		CPI di Nuoro e sedi decentrate di Dorgali e Gavoi
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Olbia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		150.040,59 €		CPI di Olbia e sede decentrata di Palau

Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Oristano	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		98.942,58 €		CPI di Oristano
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Ozieri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		38.691,43 €		CPI di Ozieri e sede decentrata di Bono
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Quartu Sant'Elena	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		86.334,64 €		CPI di Quartu Sant'Elena
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di San Gavino	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		50.780,78 €		CPI di San Gavino
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Sassari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		177.214,88 €		CPI di Sassari e sede decentrata di Porto Torres
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Sanluri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		65.144,71 €		CPI di Sanluri
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Senorbì	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		34.713,20 €		CPI di Senorbì
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Siniscola	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		44.294,31 €		CPI di Siniscola e sede decentrata di Orosei

Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Sorgono	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		31.591,40 €		CPI di Sorgono e sede decentrata di Aritzo
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Tempio	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		17.933,81 €		CPI di Tempio Pausania
Acquisto e installazione arredi per ufficio per il CPI di Terralba	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Arredi per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		38.559,97 €		CPI di Terralba
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Ales	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		5.661,87 €		CPI di Ales
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Alghero	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		10.714,10 €		CPI di Alghero
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Assemini	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		21.520,70 €		CPI di Assemini e sedi decentrate di Pula e Teulada
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Bonorva	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		9.342,24 €		CPI di Bonorva
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Cagliari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		21.731,29 €		CPI di Cagliari

Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Carbonia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		13.435,38 €		CPI di Carbonia
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Castelsardo	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		8.669,56 €		CPI di Castelsardo
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Cuglieri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		14.260,84 €		CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Ghilarza	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		12.423,84 €		CPI di Ghilarza
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Iglesias	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		12.329,55 €		CPI di Iglesias
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Isili	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		7.737,15 €		CPI di Isili
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Lanusei	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		21.888,46 €		CPI di Lanusei e sede decentrata di Tortolì
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Macomer	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		10.822,65 €		CPI di Macomer

Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Mogoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		6.571,93 €		CPI di Mogoro
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Muravera	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		8.847,10 €		CPI di Muravera
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Nuoro	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		27.402,22 €		CPI di Nuoro e sedi decentrate di Dorgali e Gavoi
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Olbia	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		45.926,00 €		CPI di Olbia, sede decentrata di Palau
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Oristano	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		30.285,38 €		CPI di Oristano
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Ozieri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		11.843,08 €		CPI di Ozieri e sede decentrata di Bono
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Quartu Sant'Elena	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		26.426,21 €		CPI di Quartu Sant'Elena
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di San Gavino	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		15.543,51 €		CPI di San Gavino

Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Sassari	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		54.243,79 €		CPI di Sassari e sede decentrata di Porto Torres
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Sanluri	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		19.940,18 €		CPI di Sanluri
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Senorbi	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		10.625,38 €		CPI di Senorbi
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Siniscola	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		13.558,07 €		CPI di Siniscola e sede decentrata di Orosei
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Sorgono	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		9.669,83 €		CPI di Sorgono e sede decentrata di Aritzo
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Tempio	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		5.489,37 €		CPI di Tempio Pausania
Forniture di sedute per ufficio per il CPI di Terralba	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sedute per ufficio Gara aggiudicata, in attesa di esecuzione del contratto		11.802,86 €		CPI di Terralba

Sistemi informativi
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 6.529.378,61
Aggiornamento Piano: € 7.139.378,61)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 409.301,58	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 5.173.884,07	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 1.556.192.96	
Allestimento postazioni virtuali	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Noleggio nr. 1000 Notebook (36 mesi)		909.644,77 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Fornitura nr. 50 Notebook	44.896,00 €			Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Noleggio licenze Microsoft O365 e adesione triennale Microsoft Azure	5.962,10 €	63.487,34 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto nr. 500 Monitor 27"		156.770,00 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto nr. 200 lettori NFC		9.028,00 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto nr. 200 tablet grafometrici elevabile a 400		83.692,00 €		Tutti i CPI

	Aggiornamento Piano PNRR	Fornitura dotazioni mancanti postazione utenti			85.400,00 €	Tutti i CPI
Implementazione dei sistemi interni	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Nuova infrastruttura informatica per i CPI		169.263,07 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Acquisto software antivirus nr. 1200 licenze durata triennale		106.309,58 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Infrastruttura e datacenter per la sede centrale		83.082,00 €		Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Fornitura attività sistemica e fornitura licenze Veem per configurazione nuovo sistema informatico		55.794,87 €		Tutti i CPI
	Aggiornamento Piano PNRR	Sala Server e fornitura switch			155.550,00 €	<ul style="list-style-type: none"> - CPI di Assemmini e sede decentrata di Pula - CPI di Isili - CPI di San Gavino - CPI di Lanusei - CPI di Bonorva - CPI di Ozieri e sede decentrata di Bono - Sede decentrata di Porto Torres, afferente al CPI di Sassari - CPI di Olbia - CPI di Nuoro, sedi decentrate di Gavoi e di Dorgali - CPI di Siniscola e sede decentrata di Orosei - CPI di Sorgono - CPI di Macomer - CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa

						- CPI di Mogoro - CPI di Iglesias
	Aggiornamento Piano PNRR	Fornitura HW UPS e WIFI			366.000,00 €	Tutti i CPI
	Aggiornamento Piano PNRR	Implementazione apparati server backup			85.400,00 €	Tutti i CPI
	Aggiornamento Piano PNRR	Implementazione Cybersecurity			183.000,00 €	Tutti i CPI
Implementazione rete fonia e dati	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Noleggio nr. 1000 SIM linea dati	65.880,00 €			Tutti i CPI
	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Potenziamento connettività CPI		27.053,50 €		CPI di Sorgono Sede decentrata di Bono, afferente alla sede decentrata di Ozieri CPI di Olbia e sede decentrata di Palau CPI di Ales CPI di Sanluri CPI di Quartu Sant'Elena CPI di Cagliari CPI di Siniscola
	Aggiornamento Piano PNRR	Firewall e implementazione fonia			131.842,96 €	Tutti i CPI

	Aggiornamento Piano PNRR	Implementazione sistema server e licenze Jabber fonia virtuale			122.000,00 €	Tutti i CPI
CPI Virtuale	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi di Video Call – Operatore virtuale - Web meeting per i colloqui collegati all'erogazione dei servizi e assistenza canali di accesso. Servizi al cittadino - Attivazione sportello SPID - Acquisto licenze/office 365 Enterprise + EMS E CAL - Adesione convenzione Consip "Microsoft Agreement Enterprise 7" - Fornitura nr. 900 Kit di firma digitale - Apparati videoconferenza - Licenze WM Ware, W2019 e SFW LOG per server CPI 	202.683,48 €	1.196.771,06 €		<p>Tutti i CPI</p> <p>Sportello SPID:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPI di Cagliari - CPI di Quartu Sant'Elena - CPI di Assemini - CPI di Sanluri - CPI di Iglesias - CPI di Terralba - CPI di Oristano - CPI di Nuoro - CPI di Sassari - CPI di Lanusei - CPI di Alghero - CPI di Olbia <p>Apparati Videoconferenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPI di Cagliari - CPI di Ales - CPI di Alghero - CPI di Assemini - CPI di Castelsardo - CPI di Carbonia - CPI di Castelsardo - CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa - CPI di Ghilarza - CPI di Iglesias - CPI di Isili - CPI di Lanusei - CPI di Macomer - CPI di Mogoro - CPI di Muravera - CPI di Nuoro - CPI di Olbia - CPI di Oristano - CPI di Ozieri - CPI di Quartu Sant'Elena - CPI di San Gavino - CPI di Sanluri - CPI di Sassari - CPI di Senorbi - CPI di Siniscola - CPI di Sorgono - CPI di Terralba - CPI di Tempio Pausania

CPI Virtuale Nuove esigenze	Aggiornamento Piano PNRR	Sistemi di facilitazione d'accesso			427.000,00 €	Tutti i CPI
Sistemi per orientamento specialistico (attuazione dei LEP E)	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	Sistemi per orientamento specialistico (attuazione dei LEP E)	89.880,00 €			Tutti i CPI
Interventi di manutenzione evolutiva SIL	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	- Sibar HR / CONT /SIL - Integrazione con Sistemi esterni in cooperazione applicativa per scambio dati - Monitoraggio – Cruscottistica - Reingegnerizzazione processi e sviluppo sezione collocamento mirato - BI Matching – Strumenti di BI e AI dedicati all'incontro domanda/offerta di lavoro e matching automatizzato		2.105.587,88 €		Tutti i CPI
SIL OML 2.0	Attività prevista nella versione del Piano ex DM n. 59/2020, approvata con DGR n. 3/4 del 2021	- Open Data Comunicazioni obbligatorie / Stati / Titoli / Servizi erogati - Strumentazione avanzata per OML		207.400,00 €		Tutti i CPI

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione. Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	39	28	11	0	0	0	56	31	55,00%	11	19,00%	14	21,00%
lug-25	39	28	11	0	0	0	56	32	57%	11	19%	13	21%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7 bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	39	28	11	0	0	0	87	40	45%	5	5%	42	48%
lug-25	39	28	11	0	0	0	87	46	52%	14	16%	27	31%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	alert
Sardegna	CPI di Cagliari	56	32	55%	11	21%	13
Sardegna	CPI di Muravera	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Ales	56	31	55%	12	21%	13
Sardegna	CPI di Assemini e CPI di Carbonia	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Bonorva	56	32	55%	11	21%	13
Sardegna	CPI di Castelsardo	56	32	55%	11	21%	13
Sardegna	CPI di Cuglieri e CPI di San Gavino Monreale	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Ghilarza	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Iglesias	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Macomer	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Mogoro	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Porto Torres, afferente al CPI di Sassari	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Alghero	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Assemini e sedi decentrate di Pula e Teulada	56	31	55%	11	21%	15
Sardegna	CPI di Carbonia	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Isili	56	31	55%	11	21%	15
Sardegna	CPI di Lanusei e sede decentrata di Tortolì	56	31	55%	11	21%	15
Sardegna	CPI di Nuoro e sedi decentrate di Dorgali e Gavoi	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Nuoro	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Olbia e sede decentrata di Palau	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Olbia	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Oristano	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Ozieri e sede decentrata di Bono	56	32	55%	11	21%	14

Sardegna	CPI di Quartu Sant'Elena	56	32	55%	12	21%	12
Sardegna	CPI di San Gavino	56	31	55%	11	21%	15
Sardegna	CPI di Sanluri	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Sassari e sede decentrata di Porto Torres	56	32	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Senorbì	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Siniscola e sede decentrata di Orosei	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Siniscola	56	31	55%	12	21%	15
Sardegna	CPI di Sorgono e sede decentrata di Aritzo	56	31	55%	12	21%	14
Sardegna	CPI di Tempio Pausania	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	CPI di Terralba	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede CPI Carbonia	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede CPI di Lanusei	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede CPI di San Gavino Monreale	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede CPI di Senorbì	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede CPI Olbia	56	31	55%	12	21%	15
Sardegna	Sede CPI Sassari	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Bosa, afferente al CPI di Cuglieri	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Dorgali, afferente al CPI di Nuoro	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Gavoi, afferente al CPI di Nuoro	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Orosei, afferente al CPI di Siniscola	56	31	55%	11	21%	14
Sardegna	Sede decentrata di Palau, afferente al CPI di Olbia	56	31	55%	12	21%	15
Sardegna	Sede decentrata di Tortolì, afferente al CPI di Lanusei	56	31	55%	11	21%	14

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	alert basso	alert medio	alert alto
Sardegna	CPI di Castelsardo	4	3		1				1
Sardegna	CPI di Sanluri	2	1		1				
Sardegna	CPI di Oristano	5	2		2				2
Sardegna	CPI di Cagliari	4	1		1				1
Sardegna	CPI di Iglesias	4	2		1				1
Sardegna	CPI di Muravera	4	2		1				1
Sardegna	CPI di Tempio Pausania	4			1				3
Sardegna	CPI di Cuglieri e sede decentrata di Bosa	1			1				
Sardegna	CPI di Ales	4	2		2				
Sardegna	CPI di Alghero	4	2		1				1
Sardegna	CPI di Assemini e sedi decentrate di Pula e Teulada	3	2		1				
Sardegna	CPI di Ghilarza	3	2		1				
Sardegna	CPI di Isili	3	2		1				
Sardegna	CPI di Macomer	3	2		1				
Sardegna	CPI di Mogoro	3	2		1				
Sardegna	CPI di Nuoro e sedi decentrate di Dorgali e Gavoi	3	2		1				
Sardegna	CPI di Ozieri e sede decentrata di Bono	3	2		1				

Sardegna	CPI di Siniscola e sede decentrata di Orosei	2	1		1			
Sardegna	CPI di Sorgono e sede decentrata di Aritzo	3	2		1			
Sardegna	CPI di Terralba	3	2		1			
Sardegna	CPI di Assemini e CPI di Carbonia	2			2			
Sardegna	Sede decentrata di Porto Torres, afferente al CPI di Sassari	3	1		1			1
Sardegna	CPI di Bonorva	3	2		1			
Sardegna	CPI di Carbonia	3	2		1			
Sardegna	CPI di Lanusei e sede decentrata di Tortolì	1			1			
Sardegna	CPI di San Gavino	3	2		1			
Sardegna	CPI di Sassari e sede decentrata di Porto Torres	3			1			2
Sardegna	CPI di Senorbì	3	2		1			
Sardegna	CPI di Nuoro	2			1			1
Sardegna	CPI di Olbia e sede decentrata di Palau	1			1			
Sardegna	CPI di Quartu Sant'Elena	4	2		2			
Sardegna	CPI di Siniscola	2			1			1
Sardegna	Sede CPI Carbonia	2			1			1
Sardegna	Sede CPI di Lanusei	2			1			1
Sardegna	Sede CPI di San Gavino Monreale	2			1			1
Sardegna	Sede CPI di Senorbì	3	1		1			1
Sardegna	Sede CPI Olbia	2			2			
Sardegna	Sede CPI Sassari	2			2			
Sardegna	Sede decentrata di Bosa, afferente al CPI di Cuglieri	4	2		2			
Sardegna	Sede decentrata di Dorgali, afferente al CPI di Nuoro	2			1			1
Sardegna	Sede decentrata di Palau, afferente al CPI di Olbia	4			3			1
Sardegna	CPI di Cuglieri e CPI di San Gavino Monreale	1			1			
Sardegna	CPI di Olbia	2			2			
Sardegna	Sede decentrata di Gavoi, afferente al CPI di Nuoro	2			1			1
Sardegna	Sede decentrata di Orosei, afferente al CPI di Siniscola	3	1		1			1
Sardegna	Sede decentrata di Tortolì, afferente al CPI di Lanusei	4		1	1			2

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<u>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</u>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGIS)
Somme assegnate DD n. 54/2022	Somme assegnate DD n.120/2023	Somme assegnate DD n.100/2024	totale assegnato	Relevant certification				
781.415,00 €	2.004.320,00 €	1.847.167,00 €	4.632.902,00 €	695			586.061,00 €	468.956,28 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
SARDEGNA	695	716	145	103%	21%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE


TOTALE BASELINE	367
TOTALE TARGET	716
TOTALE TARGET con risorse RRF	145

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
SARDEGNA	48	0	257	63	63	0	411	82	0	82	716	145	20%	63	82

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
SARDEGNA	87	87	106	87	367


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	695	695	695	695
TARGET	48	48	305	716
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	63	145

AVANZAMENTO TARGET

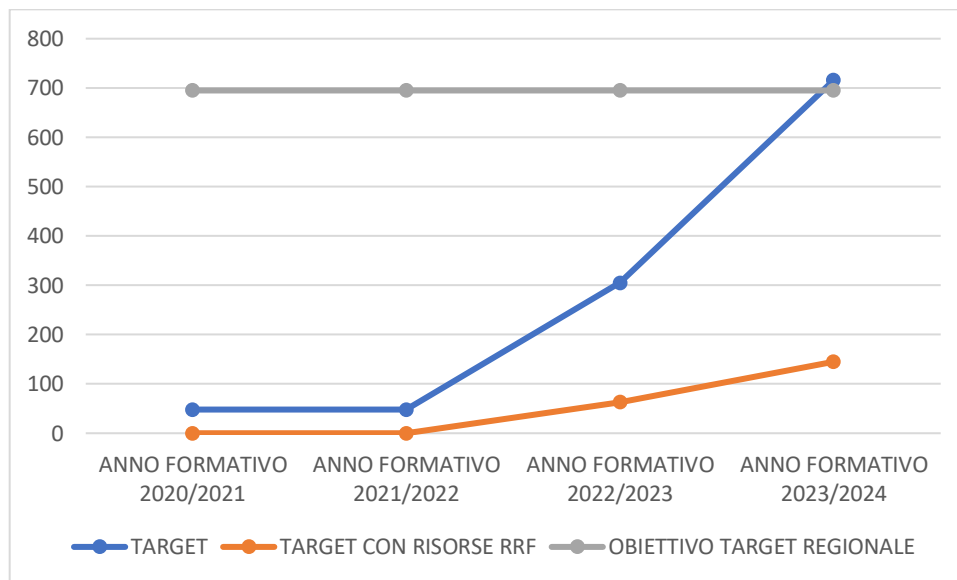

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	435	435	435	435
BASELINE	87	174	280	367

AVANZAMENTO BASELINE

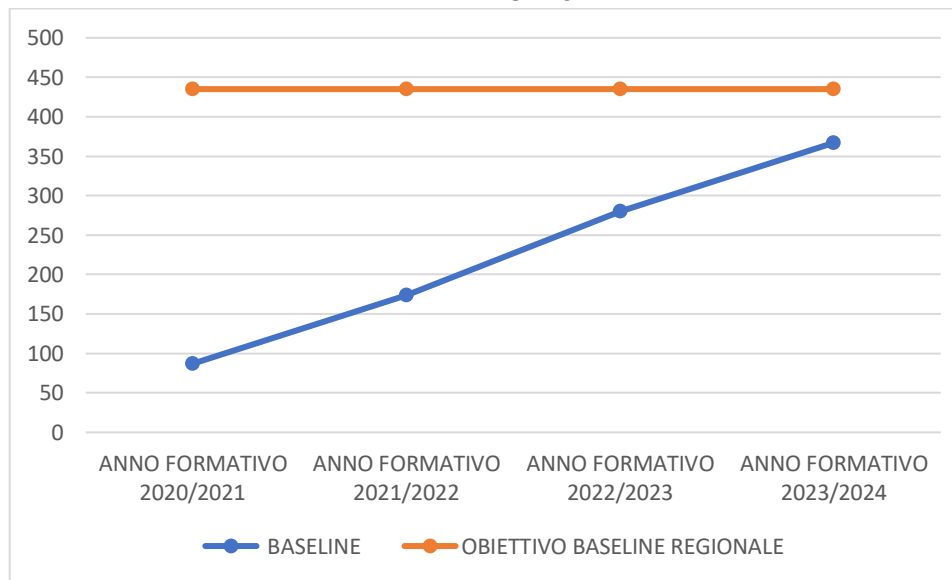

M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere,
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	<p>ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'Inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.
- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore.

Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. "Pact for skills", che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP)) della Regione Autonoma Sardegna

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30
-----	------------	---------	---------	----------------

				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000400006	S.O.So.R.	Sardegna	226.336,00 €	150	0
I52B25000890006	CIOFS-FP SARDEGNA	Sardegna	7.937,20 €	6	0
I52B25001290006	IANNAS SRL SOCIETA' BENEFIT	Sardegna	196.612,80 €	162	122

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
SARDEGNA	430.886,00 €	318	122

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H22000150006	211.500,00 €	0,00 €	30	26	3	3	30	10	1	0
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	C54H22000190006	211.500,00 €	18.902,61 €	30	Dato non validato	3	3	30	0	1	0
COMUNE DI ISILI	C64H22000330007	211.500,00 €	0,00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H22000210001	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000500006	211.500,00 €	26.073,96 €	30	12	3	3	30	0	1	0
COMUNE DI GUSPINI	E24H22000370006	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI OSILO	E34H22000030006	211.500,00 €	0,00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato

COMUNE DI OZIERI	E54H22000110006	211.500,00 €	32.904,26 €	30	1	3	1	30	1	1	Dato non validato
COMUNE DI TORTOLI'	E54H22000120006	211.500,00 €	0,00 €	30	16	3	0	30	6	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI MARGHINE	E74H22000110006	211.500,00 €	0,00 €	30	8	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI SELARGIUS	F44H22000120006	211.500,00 €	0,00 €	30	10	3	1	30	Dato non validato	1	0
COMUNE DI CARBONIA	G45I22000050001	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI BONORVA	G94H22000360001	211.500,00 €	19.962,23 €	30	20	3	Dato non validato	30	18	1	Dato non validato
COMUNE DI ORISTANO	H14H22000420006	211.500,00 €	25.400,34 €	30	30	3	3	30	22	1	1
COMUNITA MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI	H64H22000640007	211.500,00 €	0.00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000330007	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	23	100	0	1	1
COMUNE DI OZIERI	E94H22000080006	2.459.999,98 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato

COMUNE DI OLBIA	F94H2200016000 1	2.459.217,52 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI CAGLIARI	G24H220002500 06	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comun e)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI SASSARI	B24H2200007000 7	329.999,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H2200016000 6	328.506,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H2200034000 7	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI SINISCOLA	D44H2200008000 1	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI OSILO	E74H2200010000 6	329.356,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI CAGLIARI	G24H220002600 06	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000350007	210.000,00 €	31.678,35 €	578	Dato non validato	360	Dato non validato	700	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H22000220001	209.913,60 €	16.152,10 €	600	363,5	312	138,5	480	276	1	0
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000560006	210.000,00 €	46.292,55 €	517	Dato non validato	270	Dato non validato	520	Dato non validato	1	1
COMUNE DI SELARGIUS	F64H22000190006	209.934,00 €	12.775,71 €	480	0	1107	0	18	0	1	0
COMUNE DI CARBONIA	G44H22000260001	209.934,00 €	0,00 €	445	115	662	33	528	0	1	0
COMUNE DI BONORVA	G74H22000160001	210.000,00 €	0,00 €	900	0	249	0	483	0	1	Dato non validato
COMUNITA MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI	H64H22000680007	50.076,00 €	0,00 €	246	Dato non validato	1056	Dato non validato	36	Dato non validato	1	Dato non validato

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Distretto sociale	CUP			Indicatori di output				Indicatori di target			
-------------------	-----	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

(ATS/Comune)		Importo finanziamento	Spese realizzate	Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI SASSARI	B24H2200010007	715.000,00 €	202.527,78 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H22000170006	714.998,57 €	0,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	C54H22000210006	715.000,00 €	5.969,98 €	12	4	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000360007	715.000,00 €	35.149,54 €	12	2	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI DOLIANOVA	C94H22000700001	715.000,00 €	35.149,54 €	12	0	0	0	12	0	12	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H22000200001	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000570006	715.000,00 €	412.505,68 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI GUSPINI	E29G22000020006	711.906,10 €	0,00 €	12	3	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORTOLI'	E54H22000140006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI OZIERI	E54H22000240006	715.000,00 €	0,00 €	12	1	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORTOLI'	E94H22000760006	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI OLBIA	F34H23000310001	715.000,00 €	314.635,02 €	12	0	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI SELARGIUS	F44H22000130006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	Dato non validato

COMUNE DI OLBIA	F94H22000150001	715.000,00 €	251.918,85 €	12	7	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CAGLIARI	G24H22000240006	715.000,00 €	294.580,77 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CARBONIA	G45I22000060001	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI ORISTANO	H34H22000250006	695.000,00 €	0,00 €	12	12	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI NUORO	H64H22000360001	715.000,00 €	118.851,54 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	Dato non validato

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI SASSARI	B24H22000110007	710.000,00 €	148.952,81 €	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000370007	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000580006	710.000,00 €	249.075,09 €	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI OLBIA	F94H22000220001	710.000,00 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CAGLIARI	G24H22000280006	410.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ORISTANO	H14H22000390006	412.177,00 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	0

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI SASSARI	B24H22000120007	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000380007	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000590006	1.090.000,00 €	339.293,43 €	150	0	1	1	150	0	1	0
COMUNE DI TORTOLI'	E54H23000210006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI OLBIA	F94H22000230001	1.090.000,00 €	101.989,80 €	100	0	1	1	100	0	1	0
COMUNE DI CAGLIARI	G24H22000290006	280.000,00 €	0,00 €	42	0	1	0	42	0	1	0
COMUNE DI ORISTANO	H12F22000160006	237.751,00 €	0,00 €	40	0	1	0	40	0	1	0
COMUNE DI NUORO	H64H22000380001	1.090.000,00 €	0,00 €	120	0	1	0	120	0	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

